I/11 Olšany- Vyšehoří

oddíl	popis prací /(den) týden
	rok
	den
1	**km 148,010-151,336**
	Přípravné práce, vytyčení stavby, sítí
	ETAPA I km 148,010-151,336 2516m´
	Demontáž svodidel
	Frézování
	Propustky
	Stržení krajnic
	Oprava žul. kostek, obrub, chodníku
	Sanace km 149,760
	Pokládka ACP, ACL
	Pokládka SMA 29.6 2FIN
	krajnice
	Svodidla
	SDZ, VDZ
	Dokončovací práce
	ETAPA II km 148,010-148,820 810m´
	Frézování
	Propustky
	Stržení krajnic
	Oprava žul. kostek
	Pokládka ACP, ACL
	Pokládka SMA 17.7 2FIN
	krajnice
	Svodidla
	SDZ, VDZ
	Dokončovací práce

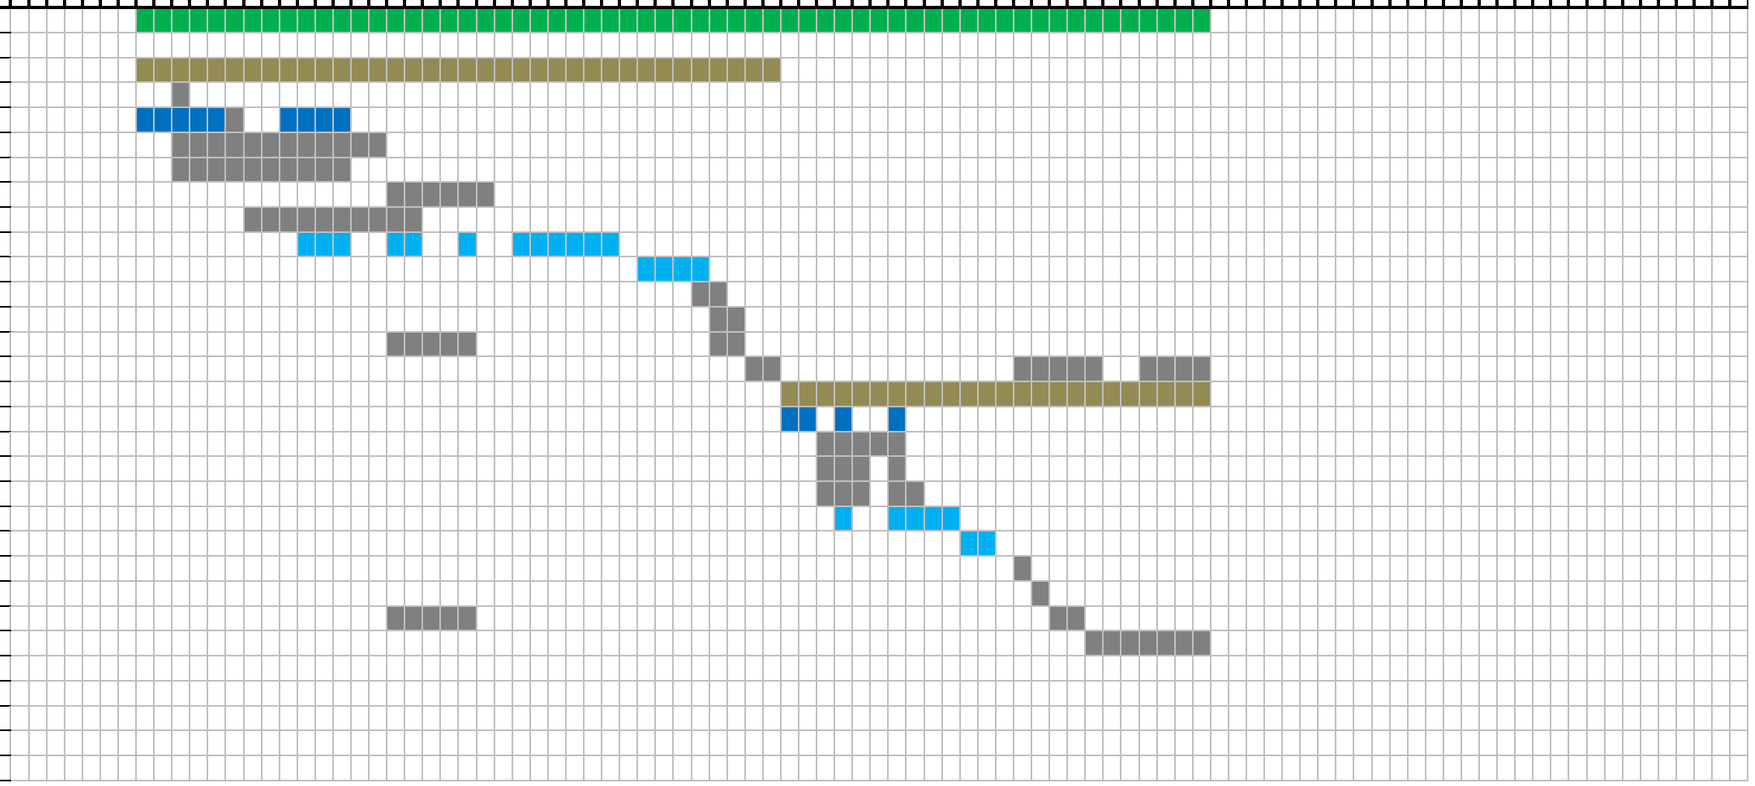

Částečná uzavírka 1.6.2026 30.7.2026 60dní
Úplná uzavírka:
ETAPA I 29.6-2.7
ETAPA II 17.7-18.7

V Bruntále dne 23.4.2026
